

Innføring velferdsteknologi Agder

Agder-samling 27.9.2018

Mål for «Innføring velferdsteknologi Agder 2020»

- Trygghets- og varslingsteknologi er integrert:
 - i helse- og omsorgstjenesten
 - i alle 30 kommunene
 - innen 2020
 - på en slik måte at bruk av trygghets- og varslings-teknologi gir gevinster
 - Økt kvalitet for tjenestemottaker, pårørende og helsepersonell
 - Spart tid
 - Unngåtte kostnader



Stauts digitale alarmer

Nr.	Kommune	Oppstartsmøte	Drift og type responstjeneste (grønt indikerer i drift)	Tjenesteforløp	Gevinstplan	Velferds- teknologiens ABC	E-læringskurs Første og andre skritt på veien
1	Kristiansand		Bemannet responscenter	Under arbeid	Under arbeid		I gang
2	Risør	23.11.2017	Bemannet responscenter	Under arbeid?	Under arbeid?	?	?
3	Gjerstad	08.12.2017	Bemannet responscenter	Nei	Nei	6	1: 20 stk
4	Tvedestrand	08.12.2017	Bemannet responscenter	Under arbeid	Forsinket	10	?
5	Froland	12.12.2017	Bemannet responscenter	Nei	Under arbeid	?	?
6	Birkenes	04.01.2018	Bemannet responscenter	Ok	ok	14 + 8 høsten 2018	Til høsten
7	Søgne	10.01.2018	Bemannet responscenter	Under arbeid ?	Under arbeid ?	Flere ?	?
8	Mandal	10.01.2018	Bemannet responscenter	ok	Under arbeid	24	ja
9	Marnardal	11.01.2018	Bemannet responscenter	Under arbeid	Under arbeid	-	Under arbeid
10	Grimstad	19.01.2018	Bemannet responscenter	Under arbeid	Under arbeid	-	-
11	Lindesnes	29.01.2018	Bemannet responscenter	Under arbeid	Under arbeid	6+0	ja
12	Lyngdal	09.02.2018	Teknisk ruting	Avventer prosjekt ?	Avventer prosjekt?	Flere	Har avtale
13	Audnedal	09.02.2018	Bemannet responscenter	Dagens ordning	Under arbeid	?	?

Responssenteret 1.jan. – 17. aug. 2018

Kommune	Antall alarmer	Antall utrykninger	Avklaringsgrad
Kristiansand	15931	3332	79%
Tvedestrand	14207	1168	92%
Mandal	12713	2666	79%
Birkenes	219	38	83%
Marnardal	371	28	92%
Risør	3986	1020	74%

Status sykesignalanlegg

Nr	Kommune	Institusjon	Oppstartsmøte (observatør i parentes)	I drift (grønt indikerer i drift)	Tjenesteforløp	Gevinstplan
1	Kristiansand	Vågsbygd tunet		23.01.2018	Under arbeid?	Under arbeid?
2	Grimstad	Frivolltunet	28.11.2017 (Froland)	29.05.2018	Under arbeid	Under arbeid
3	Grimstad	Feviktunet	28.11.2017		Under arbeid	Under arbeid
4	Grimstad	Berge gård	28.11.2017		Under arbeid	Under arbeid
5	Marnardal	Marnarheimen	18.12.2017	07.05.2018	Under arbeid	?
6	Songdalen	Songdalstunet	17.04.2018 (Arendal)		Under arbeid	?
7	Tvedestrand	Strandaneset	27.04.2018	24.09.2018		
8	Arendal		11.06.2018		Under arbeid	Under arbeid
9	Lyngdal	Nytt helsehus	20.06.2018 (Risør)		Avventer prosjekt?	Avventer prosjekt?
10	Froland		03.09. 2018 (Kvinesdal)		Nei	Nei
11	Risør		05.09. 2018 (Kristiansand)		Under arbeid?	Under arbeid?
12	Kristiansand	Kløvertun	20.09.2018			
13	Kvinesdal		11.10.2018			

Mål for «Innføring velferdsteknologi Agder 2020»

- Trygghets- og varslings teknologi er integrert:
 - i helse- og omsorgstjenesten
 - i alle 30 kommunene
 - innen 2020
 - på en slik måte at bruk av trygghets- og varslings-teknologi gir gevinster
 - Økt kvalitet for tjenestemottaker, pårørende og helsepersonell
 - Spart tid
 - Unngåtte kostnader



Status Innføring velferdsteknologi Agder

- Som dere ser er det behov for økt fokus på tjenesteinnovasjon



Prosjektorganisering aug. 2018:

**Styringsgruppe
Regionalt sammensatt**

UKG

*«Innføring velferdsteknologi Agder
2020»*

Prosjektleder: Marit Svindland

Delprosjekt 1
*«Implementering
velferdsteknologi
Agder»*

Marit Svindland

Delprosjekt 2
*«Tjenesteinnovasjon
og forvaltning»*

Marianne Holmesland

Delprosjekt 3
*«Kompetanseløftet
velferdsteknologi
Agder»*

Merethe Knatterud USHT Aust-Agder

Kontaktpersoner i alle 30 kommunene

Prosjektmedarbeidere

- USHT Aust-Agder:
 - Merethe Knatterud
 - Prosjektleder delprosjekt 3 kompetanseløftet - 40% stilling
 - Prosjektmedarbeider delprosjekt 2 tjenesteinnovasjon – 30% stilling
- USHT Vest-Agder:
 - Christina Hagtvedt Paulsen
 - Prosjektmedarbeider delprosjekt 2 tjenesteinnovasjon – 40% stilling
 - Prosjektmedarbeider delprosjekt 3 kompetanseløftet - 40% stilling
 - Har i tillegg 20% stilling som velferdsteknologikoordinator i USHT Vest-Agder
- Prosjektmedarbeider delprosjekt 2 tjenesteinnovasjon og forvaltning – Tone Ness (Kristiansand kommune) 20% ressurs ut året med fokus på forvaltning
- Informasjonssikkerhet
 - Satt av ressurser til 20% stilling
 - Foreløpig ikke klart å rekruttere til stillingen



Delprosjektgruppe 1

Implementering velferdsteknologi



Prosjektleder
Marit Svindland



KomUT
Irene Henriksen Aune



Responsssenteret
Øyvind Haarr



Ressurskommune
Tore Gryting Andersen



KomUT / testleder
Bjarne Vårdal

Delprosjektgruppe 2

Tjenesteinnovasjon og forvaltning



Delprosjektleder
Marianne Holmesland



Prosjektmedarbeider
Merethe Knatterud



Prosjektmedarbeider
Christina Hagtvedt Paulsen

Prosjektmedarbeider
Tone Ness

Delprosjektgruppe 3

Kompetanseløft velferdsteknologi



Delprosjektleder
Kompetanseløft
velferdsteknologi
Merethe Knatterud




Delprosjektleder
Tjenesteinnovasjon og
forvaltning
Marianne Holmesland



Prosjektmedarbeider
Christina Hagtvedt Paulsen

Prosjektmedarbeider
Tone Ness

Prosjektorganisering aug. 2018:

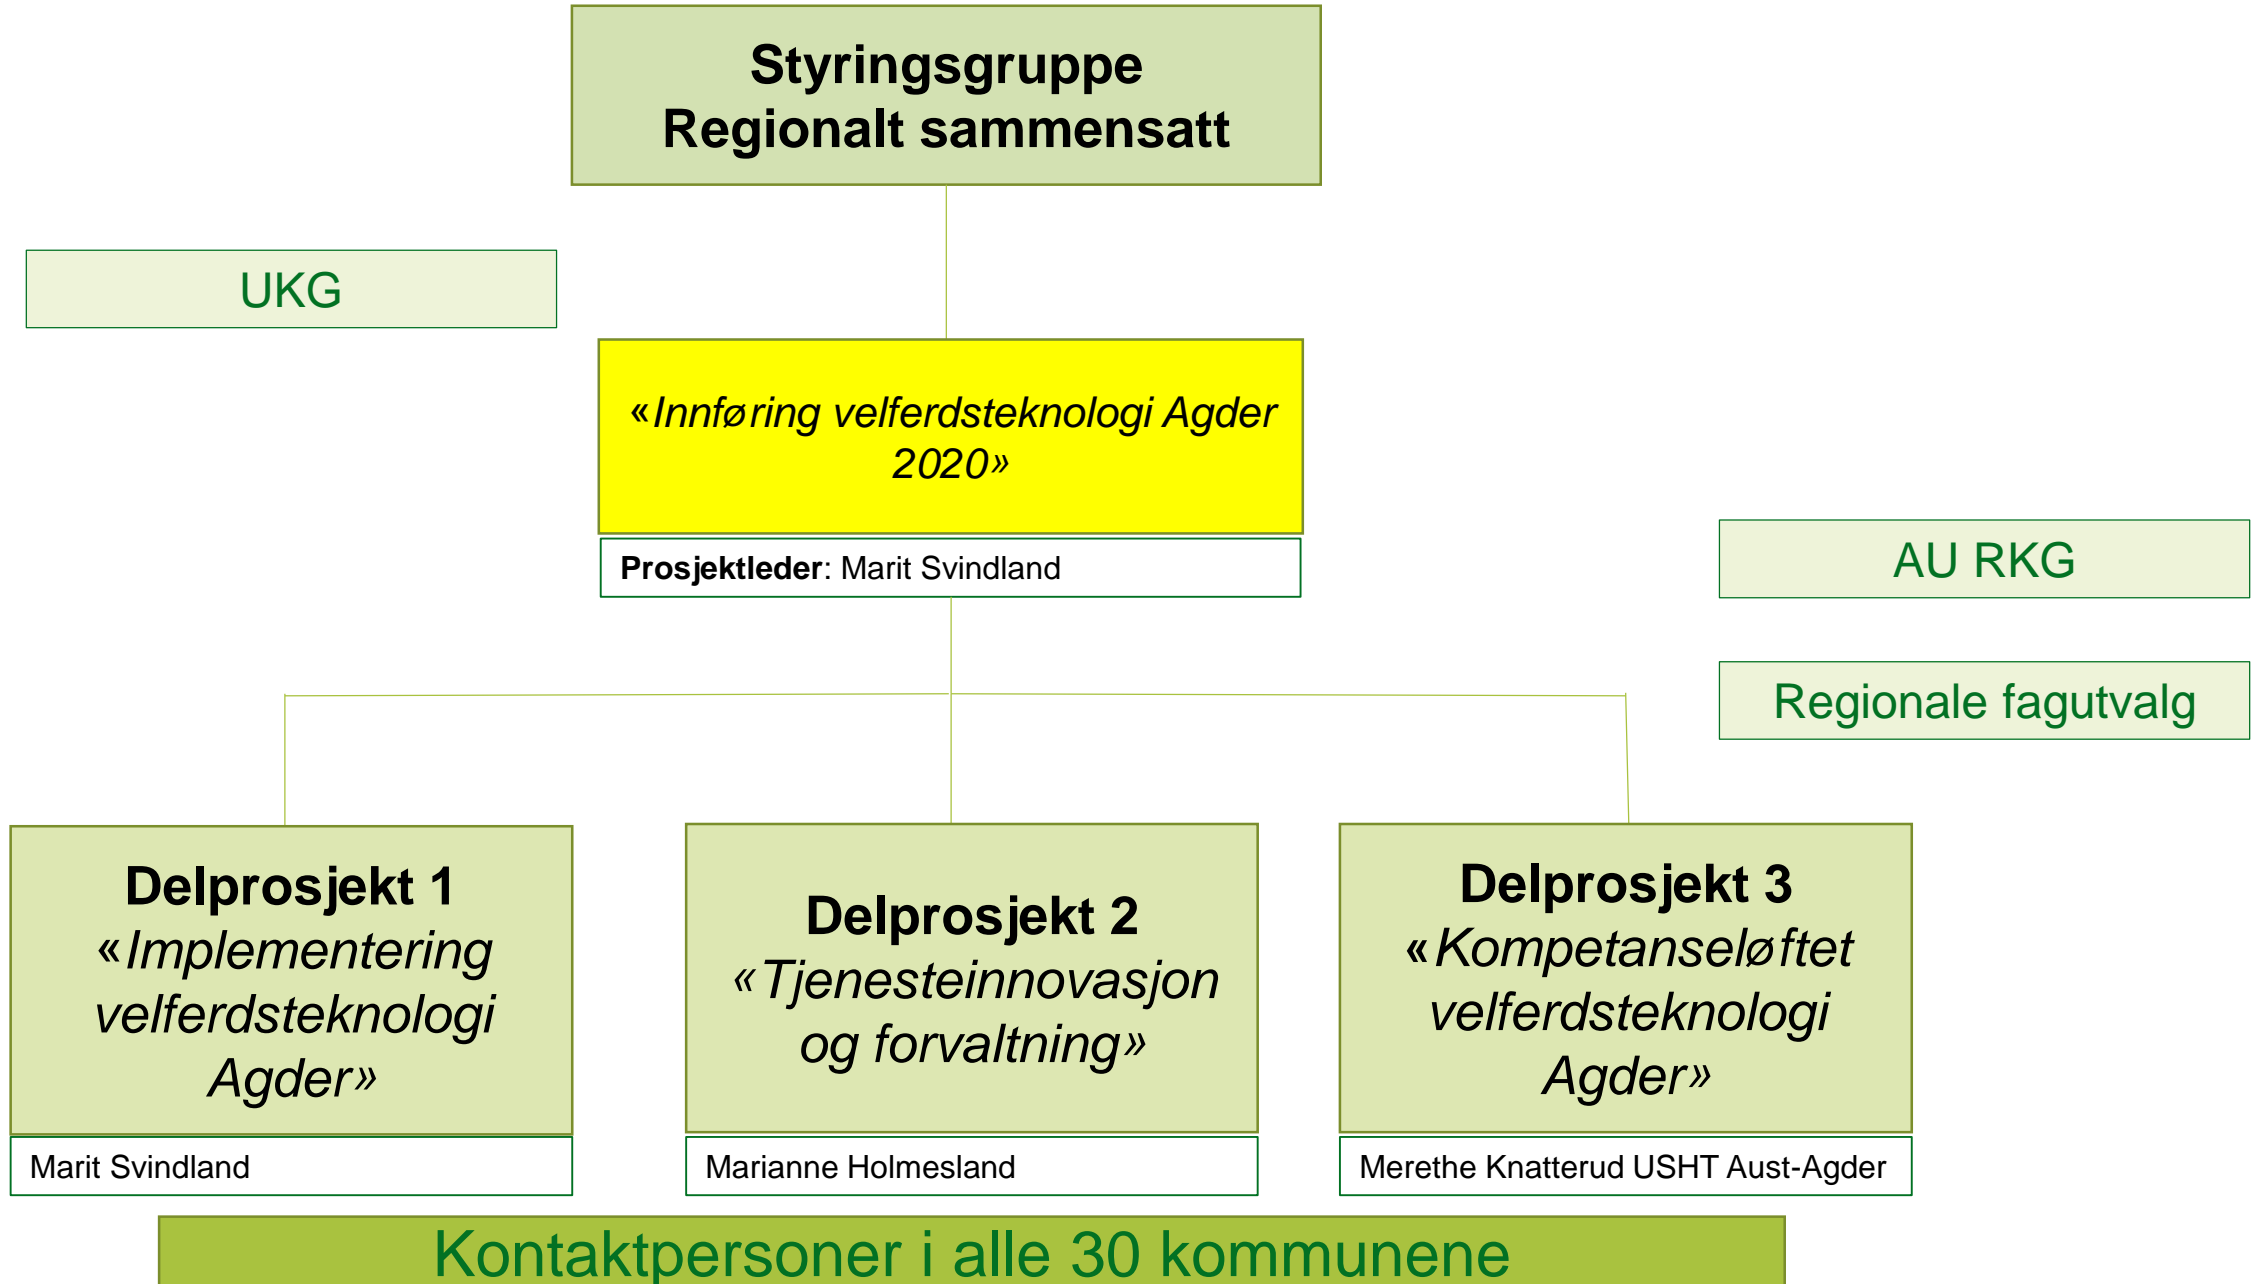

Bestilling 1 - trygghetsteknologi

Nr. (ikke prioritert rekkefølge)	Type teknologi	Kommune	Agder living lab	Oppstart
1	Sengealarm	Grimstad	Høsten 2018	April 2018
2	Kameratilsyn	Lindesnes		Juni 2018
3	Døralarm	Arendal	Høsten 2018	Aug. 2018
4	E – lås for hjemmeboende	Birkenes	Høsten 2018	Aug. 2018
5	Mobil trygghetsalarm GPS (Safemate)	Tvedestrand-Arendal	Testing pågår	
6	Medisindispenser (Medido)	Mandal		Okt. 2018
7	Medisindispenser (Evondos)	Lillesand		Nov. 2018
8	Personalalarm			
9	Bevegelsessensor			
10	Røykvarsler			
11	Kjøleskapssensor			
12	Mobil løsning for pårørende			
13	Fallalarm			
14	Fuktsensor			
15	Mobil trygghetsalarm (Safemotion)		Testet våren 2018. Rapport foreløpig ikke ferdigstilt	

Bestilling 1 trygghetsteknologi innebærer:

Leveranseplanen i kontrakten med Telenor definerer at det skal være bestilling 1 for hver type trygghetsteknologi. Det innebærer:

1. Teknisk testing (samarbeid med testleder Bjarne Vårdal)
2. Utarbeidelse av tjenesteforløp med utgangspunkt i mal fra www.ehelseagder.no
3. Utarbeidelse av gevinstplan (samarbeid med delprosjekt Tjenesteinnovasjon og forvaltning)
4. Utarbeidelse av informasjonsskriv til tjenestemottakere og ansatte (samarbeid med delprosjekt Tjenesteinnovasjon og forvaltning)
5. Utarbeidelse av ROS- analyse (samarbeid med delprosjekt Implementering)
6. Vurdering av behov for rutiner for informasjonssikkerhet (samarbeid med delprosjekt Implementering)
7. Brukerveiledninger

Nettsiden

- www.ehelseagder.no

Rapportering

- Ønsker tydeligere rapportering slik at vi kan lese:
 - Hvor langt dere er kommet i prosessen med å komme i drift med teknologien
 - Status ang. tjenesteforløp knyttet til konkret teknologi (bruk merknadsfeltet)
 - Status ang. gevinstplan knyttet til konkret teknologi (bruk merknadsfeltet)
 - Status ang. deltakelse Velferdsteknologiens ABC
 - Status ang. bruk av e-læringskursene
 - Andre aktiviteter i kommunene knyttet til innføring av velferdsteknologi

Tildelte midler 2018

PROSJEKT	SØKNADSBELØP 2018	TILDELT 2018
Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Helsedirektoratet)	6600000	1316000
Tjenesteinnovasjon og forvaltning (Fylkesmannens skjønnsmidler)	2450000	700000
Kompetanseløftet velferdsteknologi (Fylkesmannens kompetanse og innovasjonstilskudd)	1100000	350000
TOTALT	10150000	2366000

Prosjektorganisering aug. 2018:

